



Presseninformation vom 28.7.2005

Lärmsanierung der Eisenbahnen

- Stand der Arbeiten
- Vertiefungsthema 1:
Sanierung der Güterwagen
- Vertiefungsthema 2:
Kontrollmessungen
- **Fazit / Ausblick**

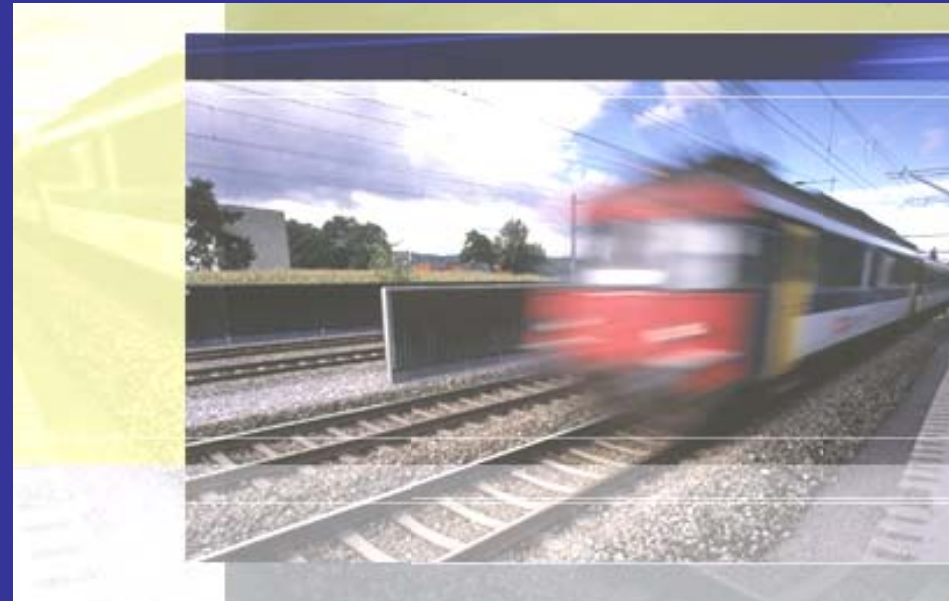


Projektstand / Fristen

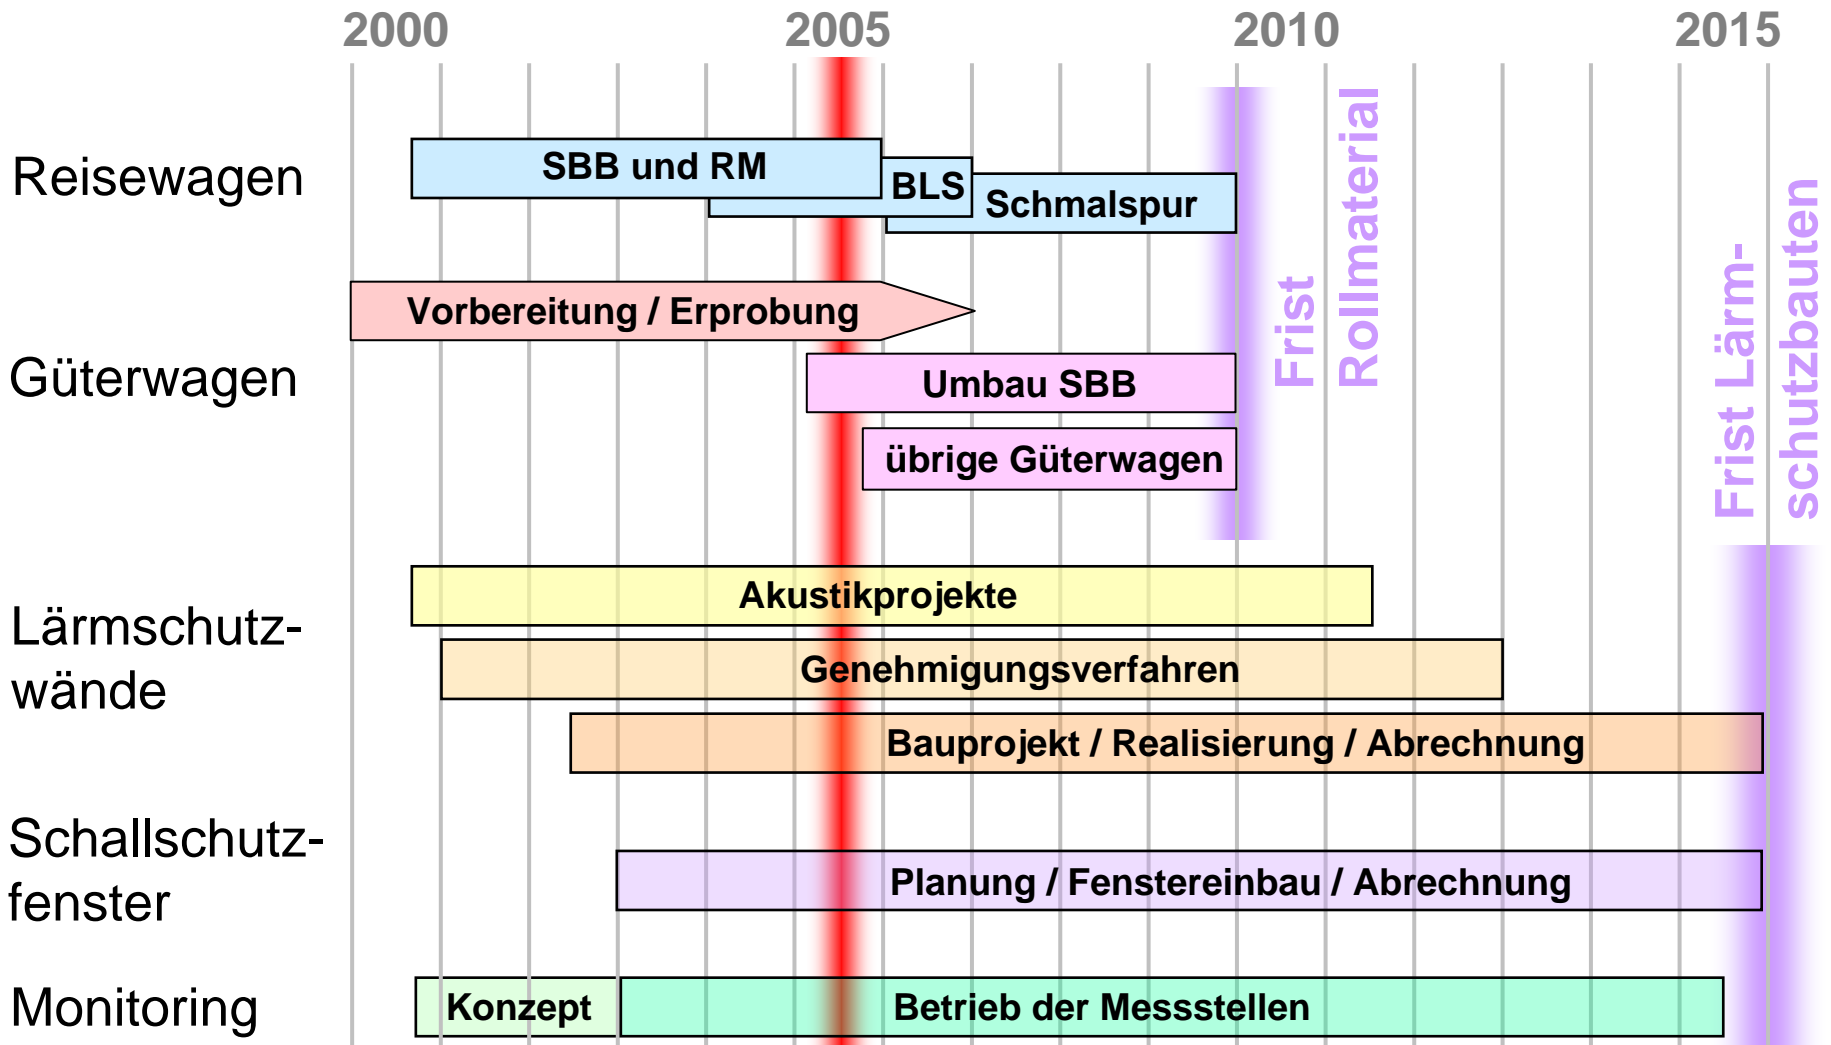

Stand per 30. Juni 2005 (Mio. sFr.):

▶ Verpflichtungskredit	1'854.0	100.0 %	
▶ Endkostenprognose 2015	1'334.4	72.0 %	100.0%

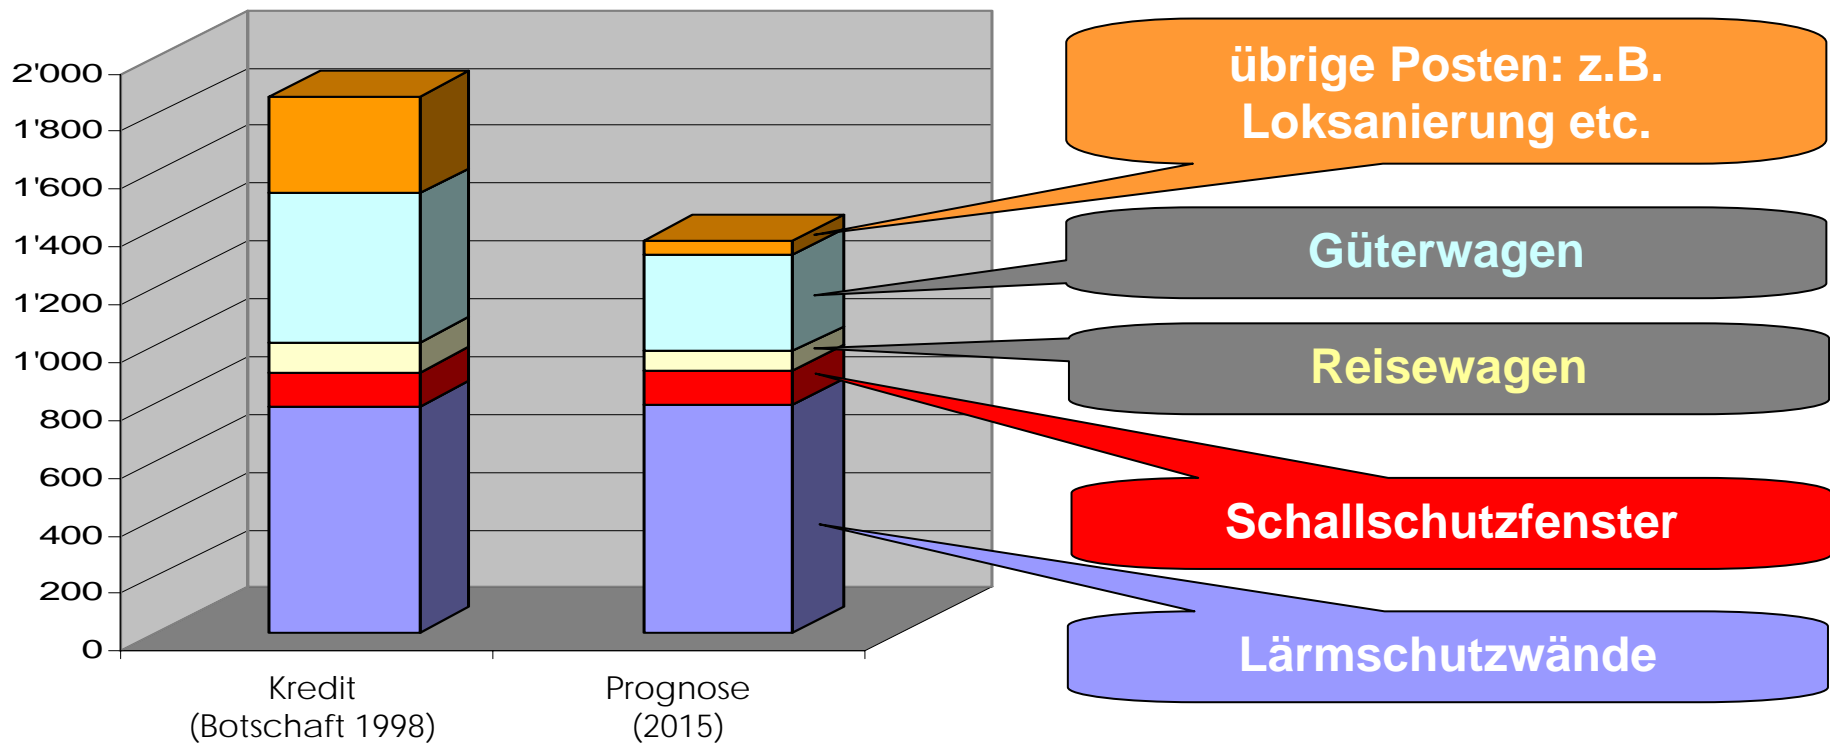


Fazit:

- ▶ Der Zeitplan stimmt
- ▶ Die Messresultate sind gut
- ▶ Die Kosten sind im Griff
- ▶ **Das Projekt ist auf Kurs**

Ausblick:

- ▶ 2006 Abschluss der Umrüstung Normalspurwagen
- ▶ 2006 Beginn der Umrüstung Schmalspurwagen
- ▶ 2012 Abschluss der Genehmigungsverfahren
- ▶ 2014 Abschluss der Bauarbeiten



Tages-Anzeiger vom 26./27. August 1995
zum Thema Finanzierung der Eisenbahn-Grossprojekte
